TUBORG HAVNEPARK - VARMEANLÆG

OVERORDNET UDFØRELSESTIDSPLAN

Dato:Wed 11-07-20
RBO/RAMBØLL

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1				
2	**Udførelsesperiode**	**54 days**	**Wed 11-07-20**	**Mon 11-10-03**
3				
4	**NCC Mangelafhjælpning - etape A og B**	**16 days**	**Mon 11-08-01**	**Mon 11-08-22**
5	Opmærkning og forindstilling af gulvvarmekredse - etape B	5 days	Mon 11-08-01	Fri 11-08-05
6	Opmærkning og forindstilling af gulvvarmekredse - etape A	5 days	Mon 11-08-08	Fri 11-08-12
7	Ændring af gulvvarme styrebokse fra lodret til vandret - etape A+ B	3 days	Mon 11-08-15	Wed 11-08-17
8	Flytning af termometre på gulvvarme blandesløjfer - etape A+ B	2 days	Thu 11-08-18	Fri 11-08-19
9	NCC - Aflevering af etape A og B til Rambøll	1 day	Mon 11-08-22	Mon 11-08-22
10				
11	**VVS-arbejder etape A**	**20 days**	**Wed 11-07-20**	**Tue 11-08-16**
12	Montage af Frese Alpha I kælder - etape A	2 days	Tue 11-07-26	Wed 11-07-27
13	Montage af Frese Alpha på gulvvarmekredse - etape A	6 days	Wed 11-07-20	Wed 11-07-27
14	Montage af TA STAP - etape A	1 day	Thu 11-07-28	Thu 11-07-28
15	Udskiftning af motorventiler- etape A	1 day	Thu 11-07-28	Thu 11-07-28
16	Montage af skabe - etape A	2 days	Thu 11-07-28	Fri 11-07-29
17	Isolering - etape A	5 days	Mon 11-08-08	Fri 11-08-12
18	FLD - Aflevering af etape A til Rambøll	2 days	Mon 11-08-15	Tue 11-08-16
19				
20	**VVS-arbejder etape B**	**6 days**	**Mon 11-08-08**	**Mon 11-08-15**
21	Montage af Frese Alpha I kælder - etape B	1 day	Mon 11-08-08	Mon 11-08-08
22	Montage af Frese Alpha på gulvvarmekredse - etape B	3 days	Mon 11-08-08	Wed 11-08-10
23	Montage af TA STAP - etape B	1 day	Thu 11-08-11	Thu 11-08-11
24	Udskiftning af motorventiler - etape B	1 day	Thu 11-08-11	Thu 11-08-11
25	Montage af skabe - etape B	2 days	Thu 11-08-11	Fri 11-08-12
26	Isolering - etape B	5 days	Mon 11-08-08	Fri 11-08-12
27	FLD - Aflevering af etape B til Rambøll	1 day	Mon 11-08-15	Mon 11-08-15
28				
29	**Indregulering etape A + B**	**15 days**	**Mon 11-08-22**	**Fri 11-09-09**
30	Indregulering etape A + B	5 days	Mon 11-08-22	Fri 11-08-26
31	Aflevering af indreguleringsrapporter A + B til Rambøll	3 days	Mon 11-09-05	Wed 11-09-07
32	Gennemsyn og godkendelse af indreguleringsrapporter A+B	2 days	Thu 11-09-08	Fri 11-09-09
33				
34	**NCC Mangelafhjælpning - etape C og D**	**16 days**	**Mon 11-08-22**	**Mon 11-09-12**
35	Opmærkning og forindstilling af gulvvarmekredse - etape C	5 days	Mon 11-08-22	Fri 11-08-26
36	Opmærkning og forindstilling af gulvvarmekredse - etape D	5 days	Mon 11-08-29	Fri 11-09-02
37	Ændring af gulvvarme styrebokse fra lodret til vandret - etape C+D	3 days	Mon 11-09-05	Wed 11-09-07
38	Flytning af termometre på gulvvarme blandesløjfer - etape C+D	2 days	Thu 11-09-08	Fri 11-09-09
39	NCC - Aflevering af etape C og D til Rambøll	1 day	Mon 11-09-12	Mon 11-09-12
40				
41	**VVS-arbejder etape C**	**13 days**	**Mon 11-08-15**	**Wed 11-08-31**
42	Montage af Frese Alpha I kælder - etape C	2 days	Mon 11-08-15	Tue 11-08-16
43	Montage af Frese Alpha på gulvvarmekredse - etape C	4 days	Tue 11-08-16	Fri 11-08-19
44	Montage af TA STAP - etape C	1 day	Fri 11-08-19	Fri 11-08-19
45	Udskiftning af motorventiler - etape C	1 day	Fri 11-08-19	Fri 11-08-19
46	Montage af skabe - etape C	2 days	Fri 11-08-19	Mon 11-08-22
47	Isolering - etape C	5 days	Mon 11-08-22	Fri 11-08-26
48	FLD - Aflevering af etape C til Rambøll	2 days	Tue 11-08-30	Wed 11-08-31
49				
50	**VVS-arbejder etape D**	**7 days**	**Mon 11-08-22**	**Tue 11-08-30**
51	Montage af Frese Alpha I kælder - etape D	2 days	Mon 11-08-22	Tue 11-08-23
52	Montage af Frese Alpha på gulvvarmekredse - etape D	3 days	Tue 11-08-23	Thu 11-08-25
53	Montage af TA STAP - etape D	1 day	Thu 11-08-25	Thu 11-08-25
54	Udskiftning af motorventiler - etape D	1 day	Fri 11-08-26	Fri 11-08-26
55	Montage af skabe - etape D	2 days	Fri 11-08-26	Mon 11-08-29
56	Isolering - etape D	5 days	Mon 11-08-22	Fri 11-08-26
57	FLD - Aflevering af etape D til Rambøll	1 day	Tue 11-08-30	Tue 11-08-30
58				
59	**Indregulering etape C + D**	**10 days**	**Mon 11-09-12**	**Fri 11-09-23**
60	Indregulering etape C + D	5 days	Mon 11-09-12	Fri 11-09-16
61	Aflevering af indreguleringsrapporter C + D til Rambøll	3 days	Mon 11-09-19	Wed 11-09-21
62	Gennemsyn og godkendelse af indreguleringsrapporter C+D	2 days	Thu 11-09-22	Fri 11-09-23
63				
64	**Opfølgning**	**6 days**	**Mon 11-09-26**	**Mon 11-10-03**
65	Udarbejdelse af As Built - materiale	5 days	Mon 11-09-26	Fri 11-09-30
66	Udarbejdelse af revideret brugermanual til ejerforeningerne	5 days	Mon 11-09-26	Fri 11-09-30
67				
68	Aflevering til Ejerforeningerne - etape A, B, C og D	1 day	Mon 11-10-03	Mon 11-10-03

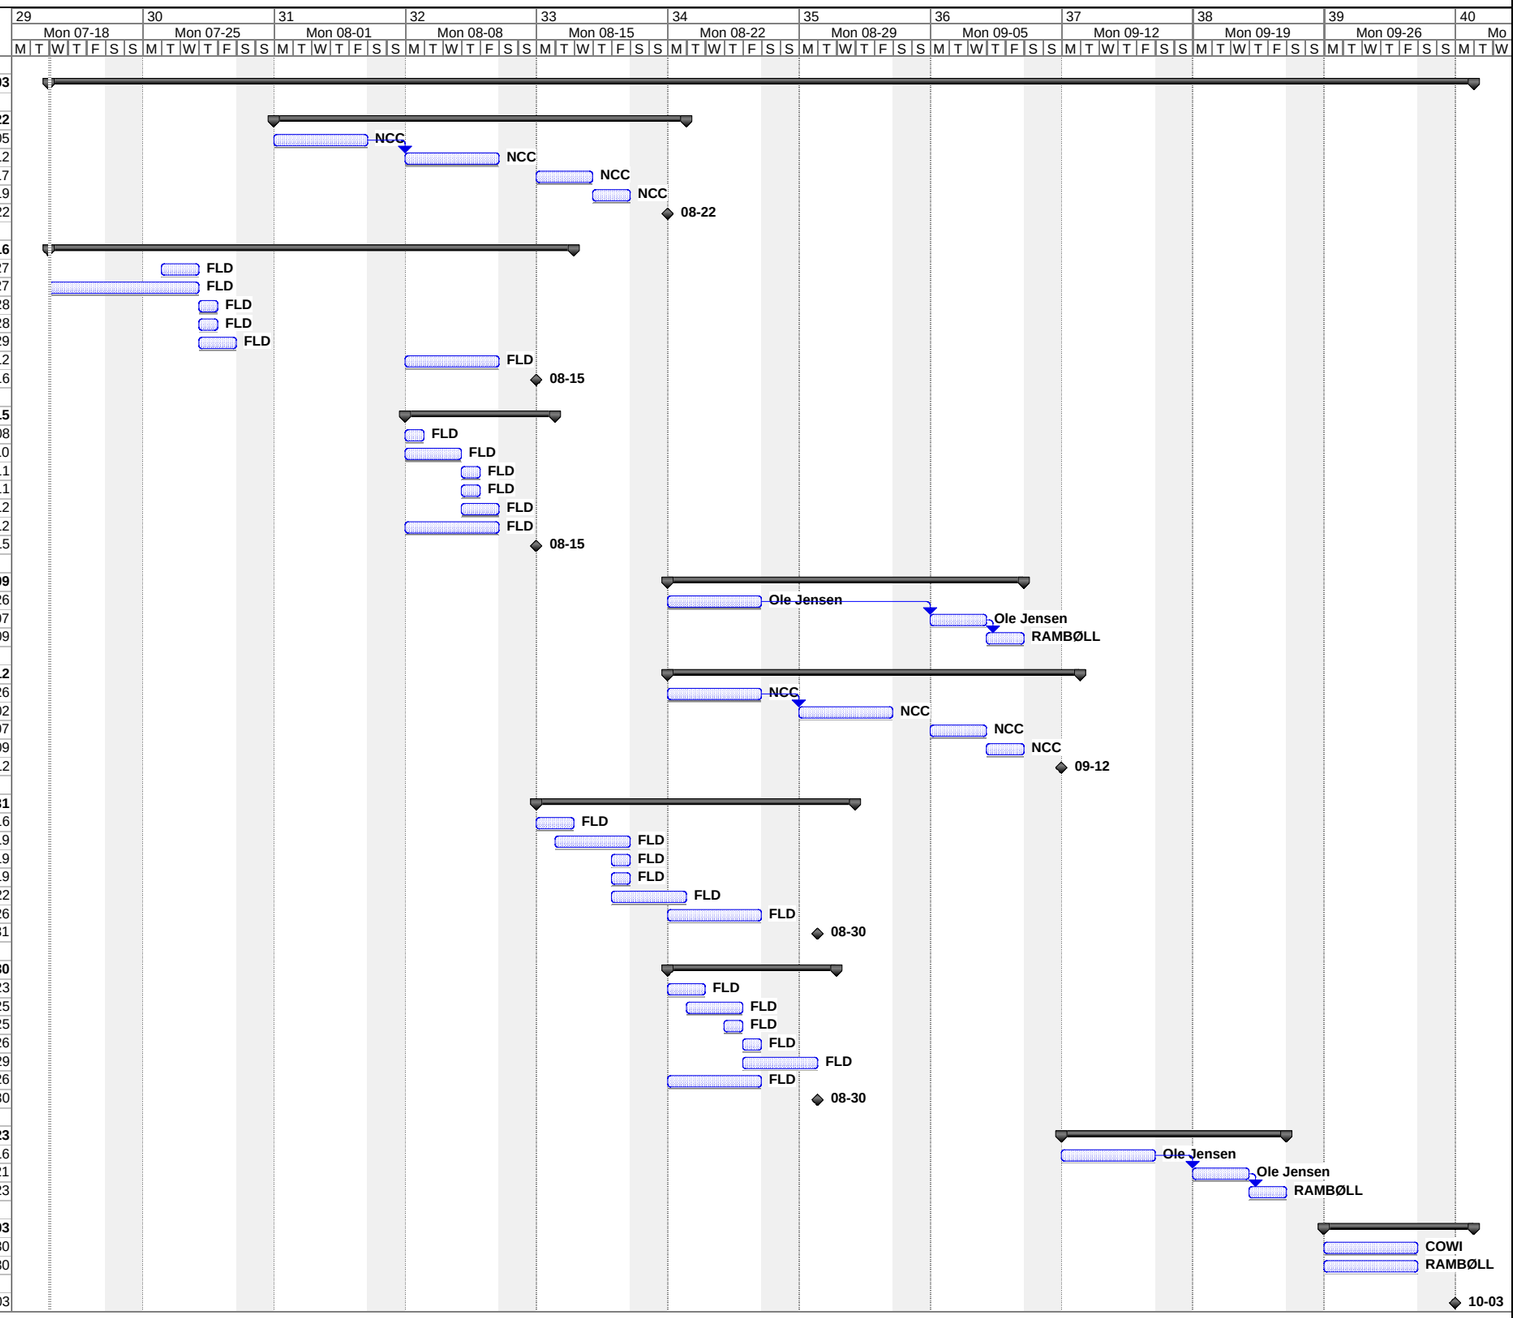

Date: Wed 11-07-20

Task | Progress | Summary | External Tasks | Deadline
Split | Milestone | Project Summary | External Milestone
